

桜島学校の工事入札について

1. 経緯

桜島学校の新築工事については、当初、県内事業者の受注機会確保の観点から、4つの工区に分けて工事の公告を行い、7月中の入札を実施したが、1工区は予定価格内での入札がなかったこと、また、2工区については入札参加者が入札を辞退したことから、いずれの入札も不調となった。

3工区及び4工区については、1工区及び2工区が不調となったことから、全体的な工事の見直しが必要と判断し、入札を取り止め、8月30日にあらためて公告を行った。


令和8年4月に開校するためには、10月中の着工が必要なことから、1・2工区と3・4工区の2つの工区で、10月4日に再度入札を行ったが、どちらの工区も不調となった。

【2回目の工事発注の見直し内容】

- ・工区割の変更（4つの工区→2つの工区）
- ・設計単価の見直し
- ・外構工事（グラウンドや植栽等）の見直し

【入札経過】

5月30日	1工区	公告
6月7日	2、3、4工区	公告
7月8日	1工区	不調
7月16日	2工区	不調（参加者辞退）
7月19日	3、4工区	入札取り止め
8月30日	1・2工区と3・4工区の2つの工区	で公告
10月4日	1・2工区、3・4工区	ともに不調
10月9日		入札不調の確定

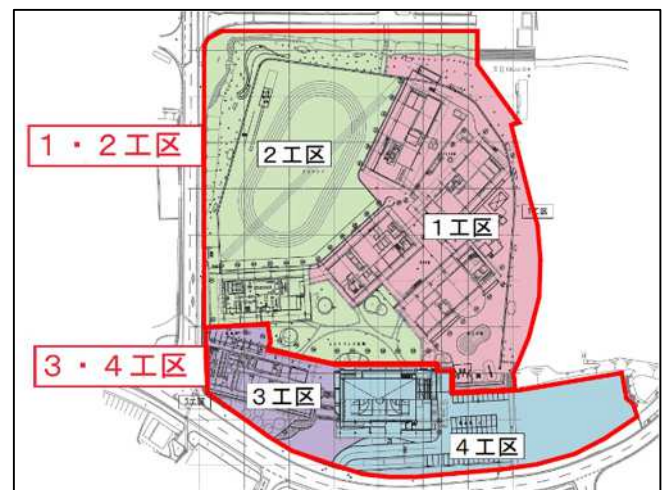

2. 今後の進め方

- ①整備検討委員会での意見の聴取
- ②今回の入札参加者へのヒアリング
- ③庁内関係部署との協議
